

CoDev Timetracking La gestion de projet avec Mantis

06 Juillet 2011



Fonctionnalités

CoDev s'appuie sur Mantis pour gérer l'avancement du projet

Saisie des CRA

- Raports d'activité
- Suivi détaillé des taches
- Levées d'alertes
- Planning
- Indicateurs de productivité
- Statistiques

Activité hebdomadaire

Équipe: PROSYS Semaine: W14 | 04 Apr - 08 Apr V 2011 V

Anne charge = 2							
Fiche	Projet	Poste	Lundi 04 Apr	Mardi 05 Apr	Mercredi 06 Apr	Jeudi 07 Apr	Vendredi 08 Apr
532 / tcp1b1_43865 : [Incognito] Intégration du jeu Incognito dans la valo afficheur caisse en INTEGRATION	Incognito	Analyse de l'existant					0.5
522 / tcp1b1_44221 : [ROMA] Erreur information afficheur caisse	ROMA	Analyse de l'existant	1		1		0.5
62 / : Reunion (generique)	SuiviOp PROSYS	N/A		0.1		0.1	
63 / : Problème de connexion session Windows (generique)		N/A				0.4	
524 / 375 : [AMIGO 1.3] Partie Stats	AMIGO 3	Developpement				0.5	
484 / top1b1_43827 : [Valorisation Gagnants - ROMA]Abscence de la variable associée au pays	ROMA	Analyse de l'existant		0.9			

Carole charge = 2.8							
Fiche	Projet	Poste		Mardi 05 Apr	Mercredi 06 Apr	Jeudi 07 Apr	Vendredi 08 Apr
60 / : Absence	SuiviOp	N/A	1		1		
62 / : Reunion (generique)	SuiviOp PROSYS	N/A		0.1			
106 / : Documentation	SuiviOp PROSYS	N/A		0.9			
535 / 375 : [AMIGO 1.3] Tests d'ensemble	AMIGO 3	Documentation				1	0.5
495 / : Workshop Mixen	SuiviOp PROSYS	N/A					0.5

Jessica charge = 0							
Fiche	Projet	Poste	Lundi 04 Apr		Mercredi 06 Apr	Jeudi 07 Apr	Vendredi 08 Apr
62 / : Reunion (generique)	SuiviOp PROSYS	N/A		0.1			
106 / : Documentation	SuiviOp PROSYS	N/A	1	0.9	1	1	1




Existant

Des taches répétitives et laborieuses

- Pas de lien entre les outils de dev et de gestion de projet (Mantis, Excel, MsProject)
 - Le CP doit aller à la pèche aux informations
 - Le CRA hebdomadaire (feuille XLS) manque de granularité
 - Report manuel des CRA dans MsProject
- Rapports hebdo/mensuels
 - Calcul d'indicateurs de production
 - Création de graphiques
 - Synthèse des points difficiles et de l'avancement


Dérives

Dérive: Nbre de jours de dépassement par rapport au budjet initial



Taux d'efficacité et Disponibilité système

Taux d'efficacité: Pourcentage de temps passé sur les fiches projet par rapport au temps total consommé (SuiviOp inclu).





Expression du besoin

Spontanéité de l'information et automatisation les taches

- Faciliter la saisie des CRA
- Informer dès que possible sur l'avancement des taches (et non en fin de semaine)
- Lever des alertes
- Générer des infos pour les rapports client

Respect des delais de livraison (100.0%)

		<u> </u>	- /
	Total	Fiches	Formule
Fiches NON livrées à temps.	0	(0)	DeliveryDate > DeadLine
Fiches livrées à temps.	1	(0) <u>608</u>	DeliveryDate <= DeadLine

Dérives - Résol	lues da	ans la p	<u>ériode</u>		
	E	TA	Effort (BI +		Description
Dérive	4.25		5.75		Nbre de jours de dépassement par rapport - Le calcul est fait sur les fiches Résolues/Fe - Les fiches réouvertes ne sont pas comptal - Si négatif, avance sur le planing.
Fiches en dérive	2	(13.6)	2	(10.6)	608, 534
Fiches à l'équilibre	1	(-0.5)	1	(0)	Fiches résolues dans les temps.
Fiches en avance	1	(-8.85)	1	(-4.85)	<u>652</u>

Dérives - En cours à ce jour


DOITEG EILO					
	E	TA		tEstim - BS)	Description
Dérive	3.10		11.10		Nbre de jours de dépassement par rapport - Le calcul est fait sur les fiches NON Resolui
Fiches en dérive	7	(30.55)	5	(11.25)	553, 468, 458, 284, 261
Fiches à l'équilibre	12	(-6.45)	19	(1.35)	Fiches résolues dans les temps.
Fiches en avance	6	(-21)	1	(-1.5)	630



Fonctionnement global

La gestion du temps en plus

- Mantis pour suivre toutes les taches quotidiennes
 - Anomalies
 - Taches de développement
 - Taches 'annexes' (Suivi Op, Outils, Incidents, Absences, Astreintes, Support, etc.)
- Ajouter la notion de temps aux fiches Mantis
 - Budget initial (nbre de jours)
 - Reste à engager
 - Date Jalon (deadline)
 - Date de livraison

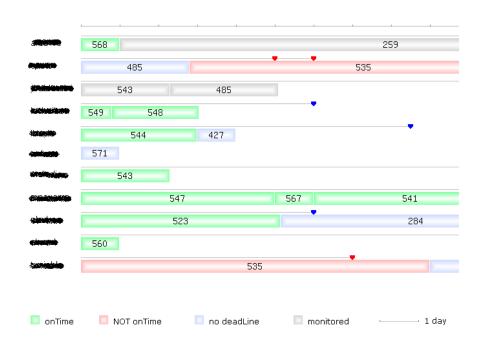



Mise en œuvre

Customisation de Mantis

- Saisie des CRA basée sur les taches Mantis
- Ajout de champs dans les fiches mantis pour permettre le suivi dans le temps
- Ajout d'un projet 'SuiviOp' regroupant toutes les taches annexes
- creation d'un module dédié au suivi des fiches, planning, statistiques, rapports.







Démonstration

Points abordés pendant la démonstration

- Exemple de fiche mantis
- Saisie de CRA
- Absences
- Activité Hebdo
- Statistiques
- Planning
- Productivité
- Info Fiche
- Administration



May 2011																															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
- California										1		0.5						1					1	1							
distribution in the			1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1
AND RESERVED												0.5				0.5									1	1	1				
tirayles					0.5	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1
Carlos Malhalan				1	0.5						1						0.2	1	1	1					1	0.5					
40-3 0-4									1											1						0.5	1				
3.63 (SEE)																															
-vandang#																							1	1	1	1	1				
Mades.				1							1							1							1						
						1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1						
diaminists)																															





Merci

Contact:

Louis BAYLE
Tel: 04 42 60 47 82
lbayle.work@gmail.com

Atos 200 Rue Pierre Duhem 13100 Aix-en-Provence

www.atos.net

Atos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldline, Atos Sphere, Atos Cloud, Atos WorldGrid are registered trademarks of Atos SA. July 2011

© 2011 Atos. Confidential information owned by Atos, to be used by the recipient only. This document, or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from Atos.

