



CoDev Timetracking

Le suivi d'activité avec Mantis

06 Juillet 2011

Fonctionnalités

CoDev s'appuie sur Mantis pour gérer l'avancement du projet

- Saisie des CRA
- Rapports d'activité
- Suivi détaillé des tâches
- Levées d'alertes
- Planning
- Indicateurs de productivité
- Statistiques

Activité hebdomadaire

Équipe: PROSYS Semaine: W14 | 04 Apr - 08 Apr 2011

Anne charge = 2

Fiche	Projet	Poste	Lundi 04 Apr	Mardi 05 Apr	Mercredi 06 Apr	Jeudi 07 Apr	Vendredi 08 Apr
532 / tcp1b1_43865 : [Incognito] Intégration du jeu Incognito dans la valo afficheur caisse en INTEGRATION	Incognito	Analyse de l'existant					0.5
522 / tcp1b1_44221 : [ROMA] Erreur information afficheur caisse	ROMA	Analyse de l'existant	1		1		0.5
62 / : Reunion (generique)	SuiviOp PROSYS	N/A		0.1		0.1	
63 / : Problème de connexion session Windows (generique)	SuiviOp PROSYS	N/A				0.4	
524 / 375 : [AMIGO 1.3] Partie Stats	AMIGO 3	Developpement				0.5	
484 / tcp1b1_43827 : [Valorisation Gagnants - ROMA] Absence de la variable associée au pays	ROMA	Analyse de l'existant		0.9			

Carole charge = 2.8

Fiche	Projet	Poste	Lundi 04 Apr	Mardi 05 Apr	Mercredi 06 Apr	Jeudi 07 Apr	Vendredi 08 Apr
60 / : Absence	SuiviOp	N/A	1		1		
62 / : Reunion (generique)	SuiviOp PROSYS	N/A		0.1			
106 / : Documentation	SuiviOp PROSYS	N/A		0.9			
535 / 375 : [AMIGO 1.3] Tests d'ensemble	AMIGO 3	Documentation				1	0.5
485 / : Workshop Mixen	SuiviOp PROSYS	N/A				0.5	

Jessica charge = 0

Fiche	Projet	Poste	Lundi 04 Apr	Mardi 05 Apr	Mercredi 06 Apr	Jeudi 07 Apr	Vendredi 08 Apr
62 / : Reunion (generique)	SuiviOp PROSYS	N/A		0.1			
106 / : Documentation	SuiviOp PROSYS	N/A	1	0.9	1	1	1

Existant

Des tâches récurrentes et laborieuses

► Suivi des tâches

- Le chef de projet va à la pêche aux informations
- Le CRA hebdomadaire (feuille XLS) manque de granularité
- Difficulté à évaluer les axes d'amélioration de l'équipe
- Pas de lien entre les outils de dev et les outils de gestion de projet

► Rapports hebdo/mensuels

- Calcul d'indicateurs de production
- Création de graphiques
- Synthèse des points difficiles et de l'avancement

Expression du besoin

Spontanéité de l'information et automatisation des tâches

- Faciliter la saisie des CRA
- Informer dès que possible sur l'avancement des tâches (et non en fin de semaine)
- Lever des alertes
- Générer des infos pour les rapports client

Respect des délais de livraison (100.0%)

	Total	Fiches	Formule
Fiches NON livrées à temps.	0	(0)	DeliveryDate > DeadLine
Fiches livrées à temps.	1	(0) 608	DeliveryDate <= DeadLine

Dérives - Résolues dans la période

	ETA	EffortEstim (BI + BS)	Description
Dérive	4.25	5.75	Nbre de jours de dépassement par rapport. - Le calcul est fait sur les fiches Résolues/Fe - Les fiches réouvertes ne sont pas comptabilisées - Si négatif, avance sur le planing.
Fiches en dérive	2 (13.6)	(10.6) 608 , 534	
Fiches à l'équilibre	1 (-0.5)	1 (0)	Fiches résolues dans les temps.
Fiches en avance	1 (-8.85)	1 (-4.85) 652	


Dérives - En cours à ce jour

	ETA	EffortEstim (BI + BS)	Description
Dérive	3.10	11.10	Nbre de jours de dépassement par rapport. - Le calcul est fait sur les fiches NON Résolues
Fiches en dérive	7 (30.55)	5 (11.25) 553 , 468 , 458 , 284 , 261	
Fiches à l'équilibre	12 (-6.45)	19 (1.35)	Fiches résolues dans les temps.
Fiches en avance	6 (-21)	1 (-1.5) 630	

Fonctionnement global

La gestion du temps en plus

- ▶ Mantis pour suivre toutes les tâches quotidiennes
 - Anomalies
 - Taches de développement
 - Taches 'annexes' (Suivi Op, Outils, Incidents, Absences, Astreintes, Support, etc.)
- ▶ Ajouter la notion de temps aux fiches Mantis
 - Budget initial (nbre de jours)
 - Reste à engager
 - Date Jalon (deadline)
 - Date de livraison

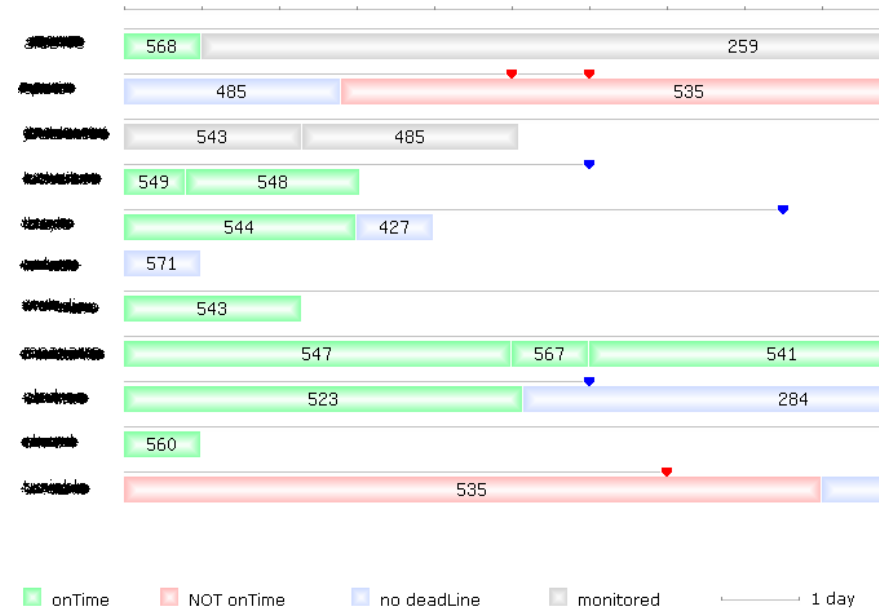

Mise en œuvre

Customisation de Mantis

- ▶ Saisie des CRA basée sur les tâches Mantis
- ▶ Ajout de champs dans les fiches mantis pour permettre le suivi dans le temps
- ▶ Ajout d'un projet 'SuiviOp' regroupant toutes les taches annexes
- ▶ creation d'un module dédié au suivi des fiches, planning, statistiques, rapports.

Projets de SuiviOp

☒ Ajouter le projet de SuiviOp commun *

☒ Créer un projet de SuiviOp Spécifique

• **Nom du Projet** *

• **Catégories**

☐ Inactivité

☒ Gestion de Projet * *(Réunion, Avant-vente, Suivi de projet, ...)*

☒ Incident *(Serveur inaccessible, ...)*

☒ Outillage *(Admin Sys, Scripts, ...)*

☒ Capitalisation *(Support, Doc, Formation, Wiki, ...)*

• **Champs personnalisés**

☒ Champs CoDev * *(BI, BS, RAE, DeadLine, Date de Livraison)*

• **Taches de SuiviOp**

☒ Gestion de Projet

☒ Gestion de Projet

☐ Incident

☐ Outillage

☐ Capitalisation

Points abordés pendant la démonstration

- ▶ Exemple de fiche mantis
- ▶ Saisie de CRA
- ▶ Absences
- ▶ Activité Hebdo
- ▶ Statistiques
- ▶ Planning
- ▶ Productivité
- ▶ Info Fiche
- ▶ Administration

April 2011

[illegible]

May 2011

[illegible]

June 2011

[illegible]

Merci

Contact:

Louis BAYLE
Tel: 04 42 60 47 82
lbayle.work@gmail.com

Atos
200 Rue Pierre Duhem
13100 Aix-en-Provence

www.atos.net

Atos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldline, Atos Sphere, Atos Cloud, Atos WorldGrid are registered trademarks of Atos SA. July 2011

© 2011 Atos. Confidential information owned by Atos, to be used by the recipient only. This document, or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from Atos.

Your business technologists. **Powering progress**

© Confidential

